


PLANIMETRIA FASE 1
SCALA 1:200

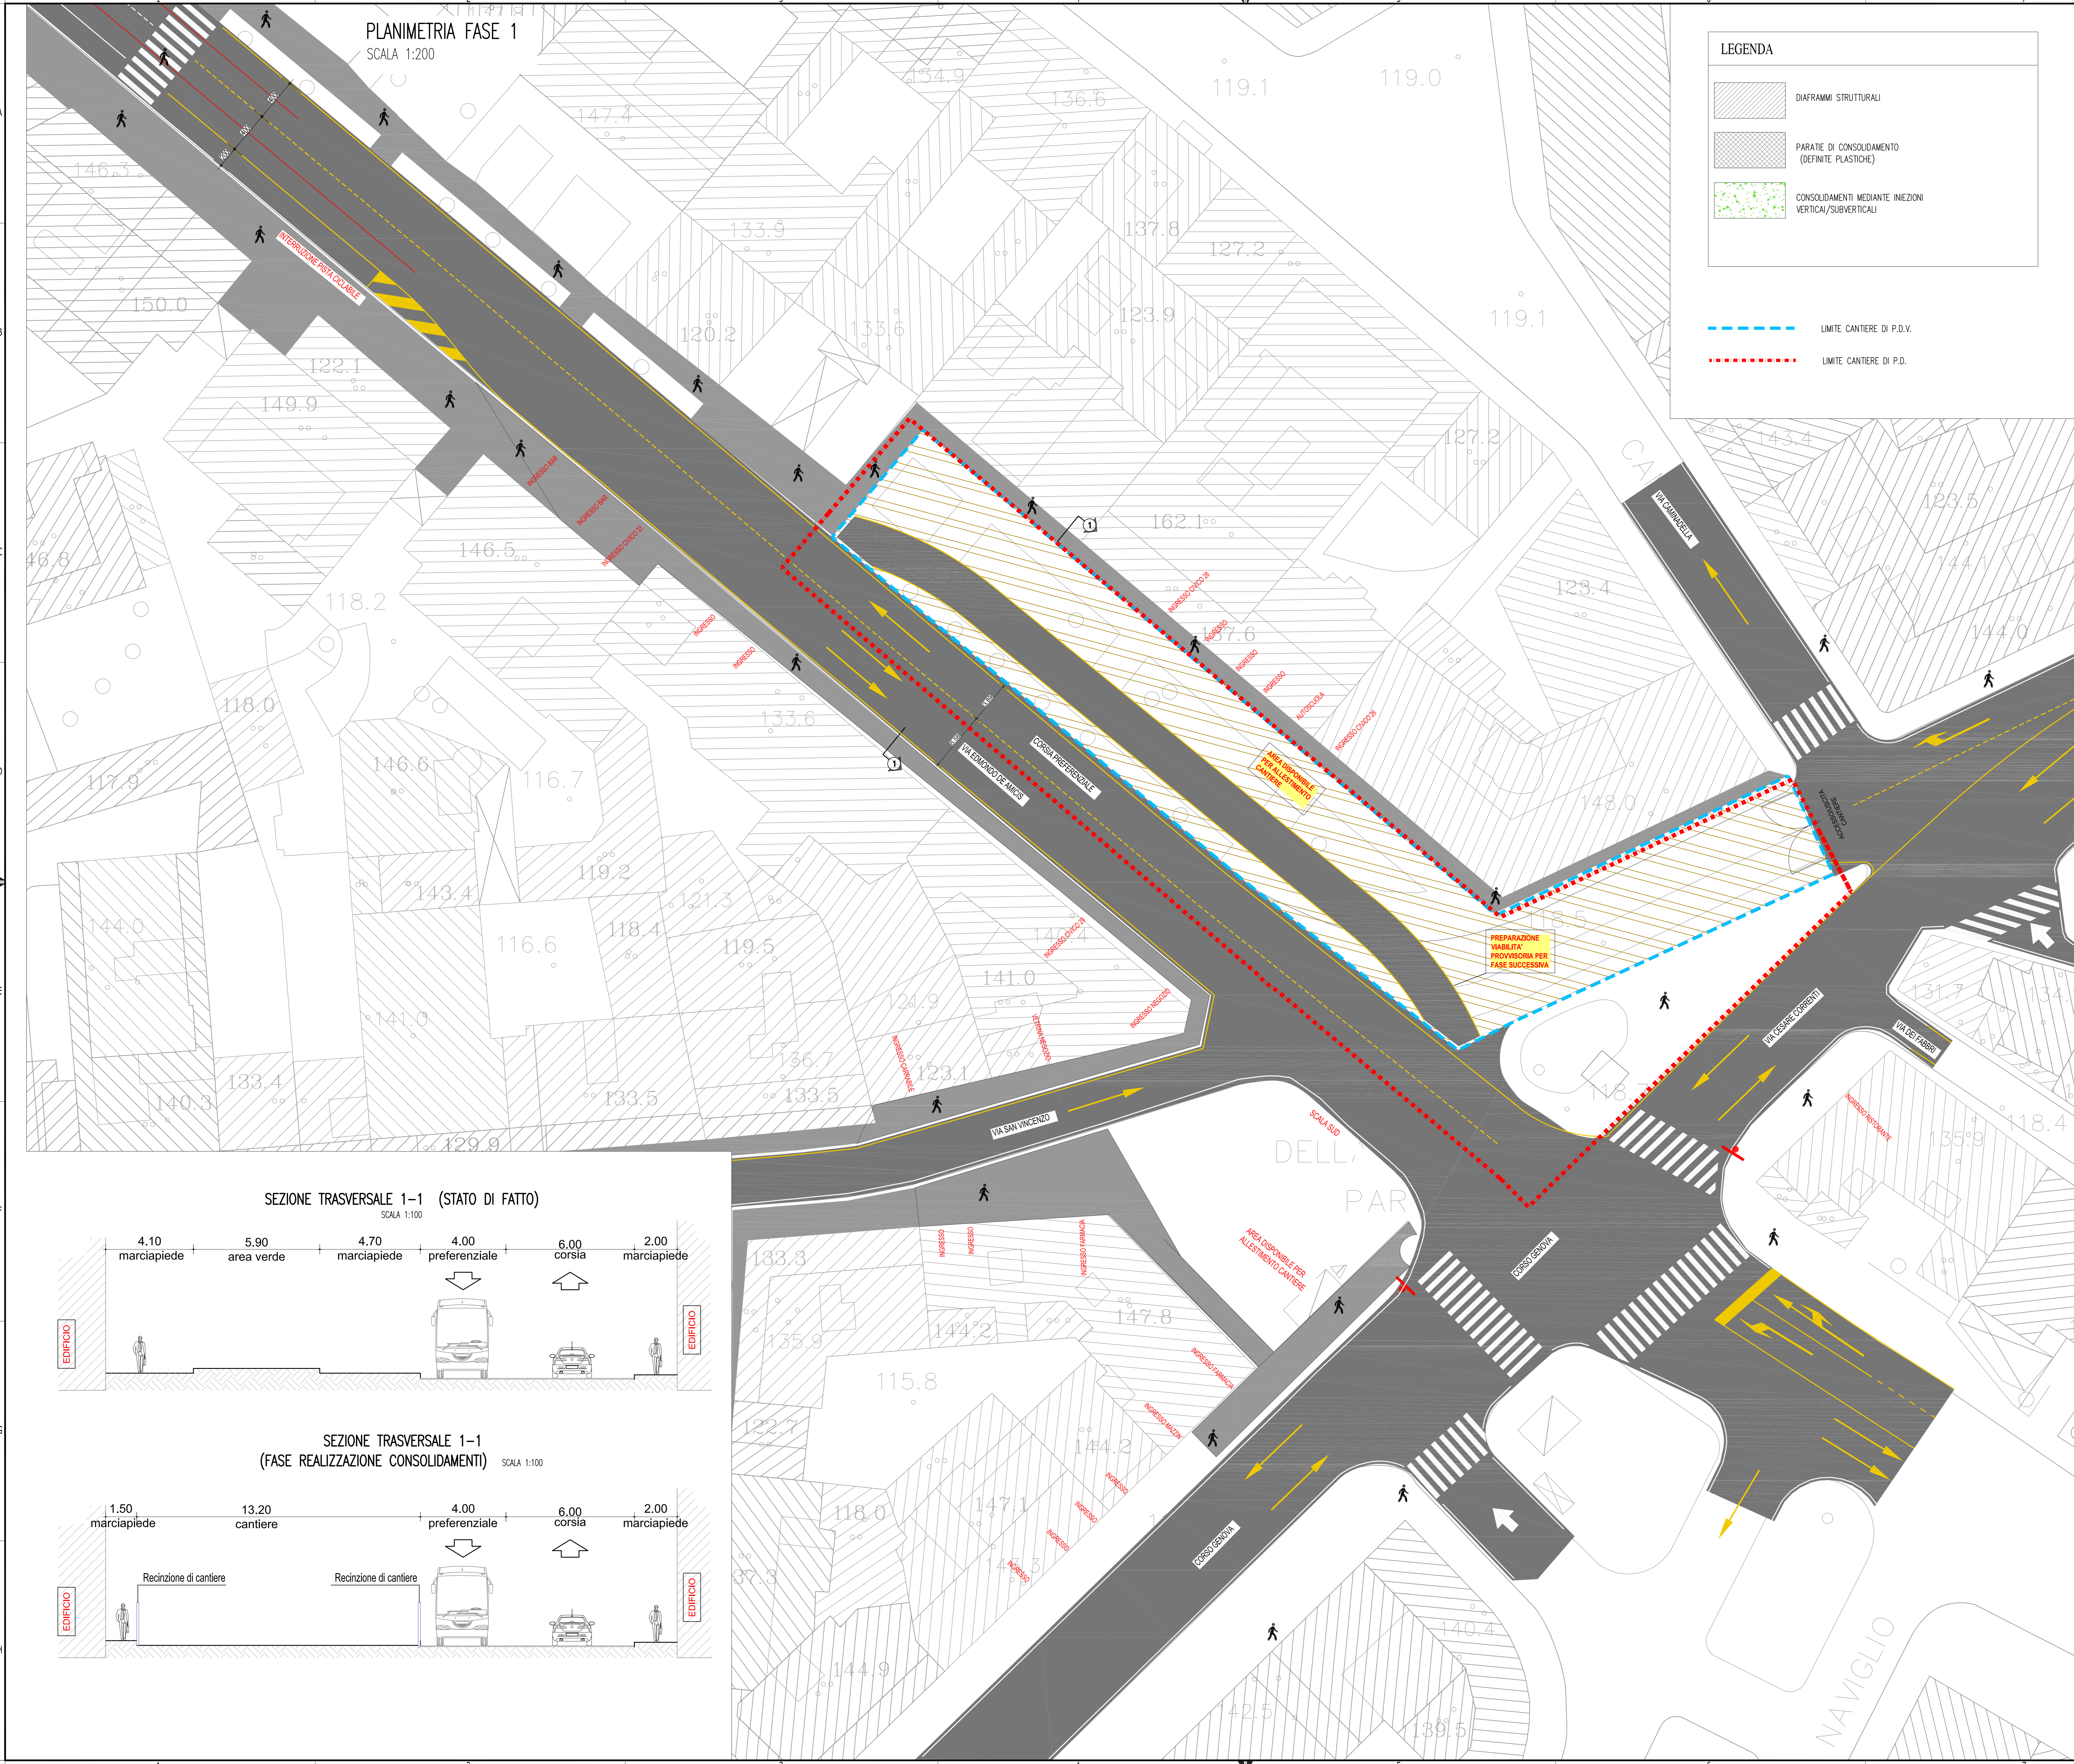


LEGENDA


- DIAGRAMMI STRUTTURALI
- PARATE DI CONSOLIDAMENTO (DEFINITE PLASTICHE)
- CONSOLIDAMENTI MEDIANTE INIEZIONI VERTICALI/SUBVERTICALI
- LIMITE CANTIERE DI P.D.V.
- LIMITE CANTIERE DI P.D.

- FASE 1- IMPEDIMENTI DA RIMUOVERE VIA DE AMICIS LATO NORD (CIVICI PARI)
- ✓ DISSUASORI DI SOSTA
 - ✓ BLOCCO IN PIETRA DI NON INTERESSE CULTURALE
 - ✓ SOGGEZIONE AL CARICO E SCARICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ANTISTANTI ALLA RECINZIONE DI CANTIERE IN QUANTO I RIFORMIMENTI POTRANNO AVVENIRE SOLTANTO ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI. GLI ESERCIZI OGGI PRESENTI SONO I SEGUENTI: BANCA INTESA S. PAOLO, AUTOSCUOLA DE AMICIS, WINE BAR, ATTELIER, WAG, RISTORANTE GIAPPONESE (HA I TAVOLINI SUL MARCIAPIEDE), PLEASURES, AGENZIA VIAGGI NEESSIE VIAGGI
 - ✓ SOGGEZIONE PER EVENTUALI CARICHI/SCARICHI/TRASLOCCHI PER I CIVICI N. 26-28-30
- FASE 1- LAVORAZIONI PREVISTE VIA DE AMICIS LATO NORD
- TAGLIO ALBERATURE
 - CANTIERIZZAZIONE
 - RIMOZIONE CORDOLI ED ARREDI
 - REALIZZAZIONE FLESSO STRADALE SENZA INTERFERENZA CON VIABILITA' ESISTENTE
 - ATTIVAZIONE VIABILITA' DEVIATA
 - SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI: REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA PER ALLACCIO EDIFICI- SPOSTAMENTO A2A EQUIDOTTO
 - VERIFICA DIMENSIONI REALI INTERCAPEDINI EDIFICI
- FASE 1 - DURATA PREVISTA 2,5 MESI CIRCA (NELL'IPOTESI CHE LE AREE SIANO LIBERE DA IMPEDIMENTI)
- VINCOLI SOTTOSERVIZI FASE 1: SPOSTAMENTO A2A GAS SOGGETTO A VINCOLO DI STAGIONALITA'
- IMPEDIMENTI DA RIMUOVERE PER LA FASE 2 LATO VIA DI SAN VINCENZO SCALA SUD
- ✓ BIKE SHARING
 - ✓ EDICOLA GIORNALI
 - ✓ VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON LE ATTIVITA' DI CANTIERE DEL PALO TENDITORE LINEA DI CONTATTO TRAM;
 - ✓ SOGGEZIONE ALLE VETRINE DELLA FARMACIA SANT. AGOSTINO

SEZIONE TRASVERSALE 1-1 (STATO DI FATTO)
SCALA 1:100

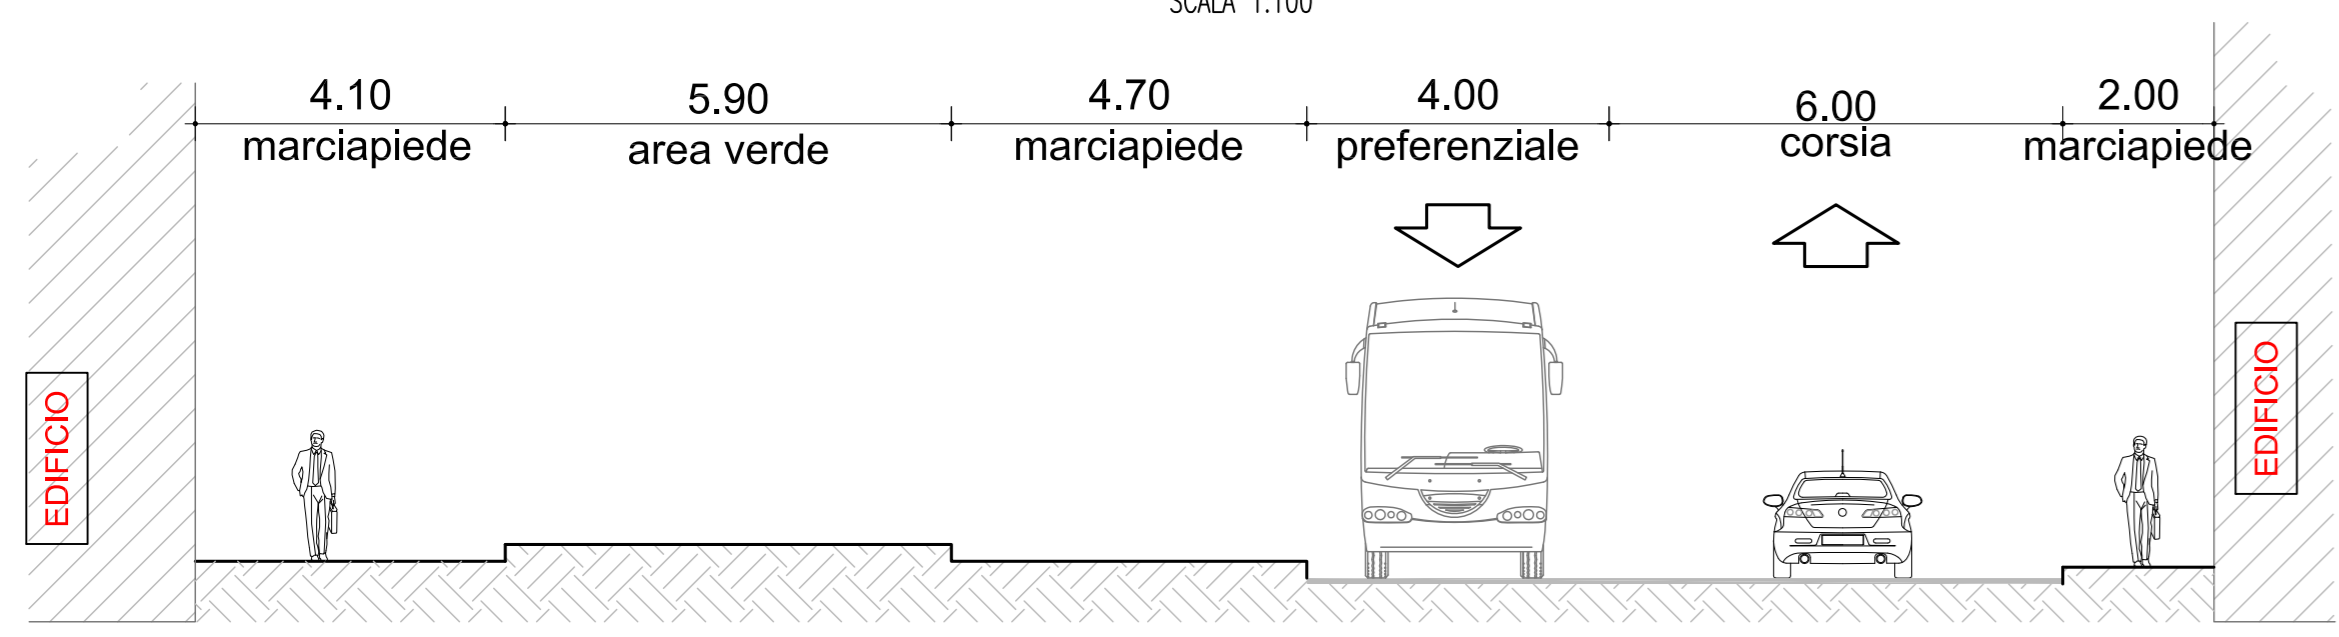

SEZIONE TRASVERSALE 1-1 (FASE REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTI)
SCALA 1:100

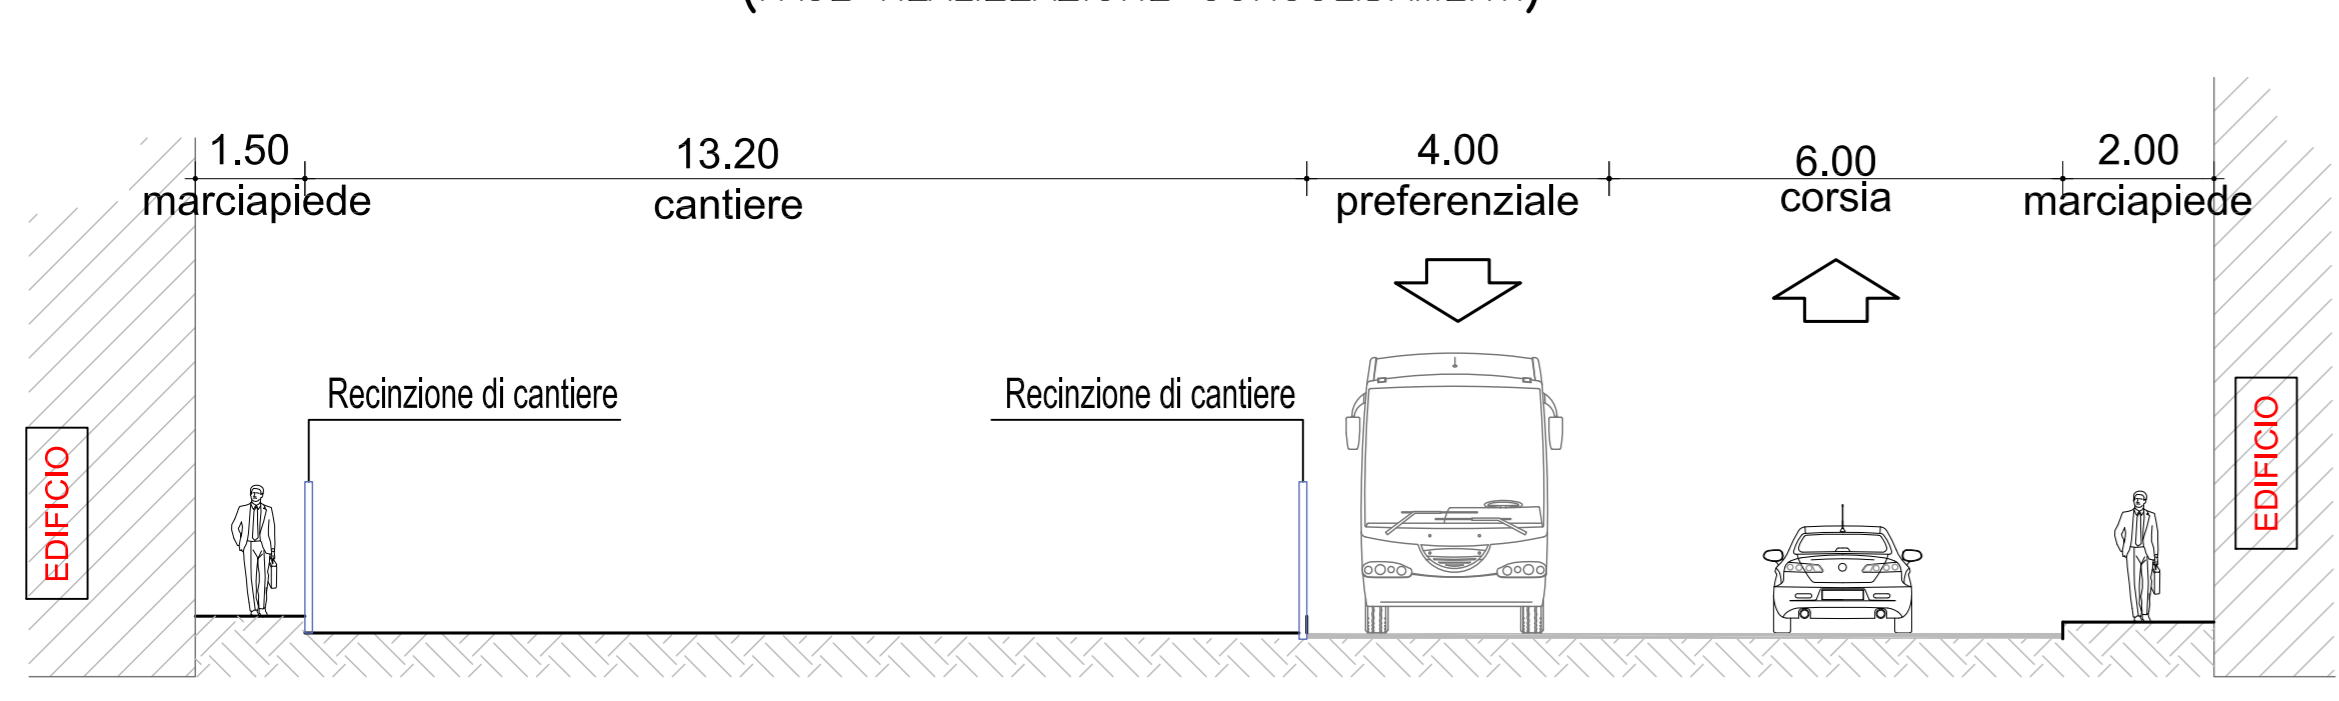

CONCEDENTE: Milano Comune di Milano

CONCESSIONARIA: LINEA M4 SPV LINEA M4 S.p.A.

CONTRAENTE EPC: CONSORZIO MM4

LINEA METROPOLITANA 4 DI MILANO LORENTEGGIO - LINATE



COMUNE DI MILANO - RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ing. Francesco Taricone)	AMAT - ALTA VIGILANZA (Ing. Camilla De Michel)
M4 S.p.A. (Ing. Giorgio Desider)	MM METROPOLITANA MILANESE S.p.A. - IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Francesco Venza)
CONSORZIO MM4 (Ing. Enrico Zorzi)	SOGGETTO ESECUTORE (Ing. Massimo Lodico - METRO BLU S.c.r.l.)
IL PROGETTISTA (Ing. Alessio Carattucci - METRO BLU S.c.r.l.)	RESP. INTEGRAZIONI DISCIPLINE SPECIALISTICHE (Ing. Gregorio Brada)

PROGETTO DEFINITIVO DIVARIANTE

Categoria: VARIANTE CENTRO - CANTIERIZZAZIONE
 Tipo opera - opera: STAZIONE DE AMICIS
 Parte d'opera: VIABILITA' PROVVISORIA
 Disciplina specialistica: -
 Titolo elaborato: DEVIAZIONI STRADALI E CANTIERIZZAZIONE FASE 1 di 3

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	16.12.2015	EMISSIONE	G. Ordino	G. Piro	A. Carattucci
